



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

ที่ สน ๗๗๖๐๖/๕๓๓ วันที่ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง ตรวจสอบการควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และได้ทำสำเนาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ทราบแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนราชการกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน เรื่อง ขออนุมัติเข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองช่าง ระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน - ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ๑๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามบันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายในที่ สน ๗๗๖๐๖/๓๘๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

๑. เพื่อให้ทราบว่า การควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้ทราบว่า การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดไว้ใน

สัญญา

๓. เพื่อให้ทราบว่า การควบคุมการก่อสร้าง มีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม
๔. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ

๕. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการควบคุมการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

๓. สรุปผลการตรวจสอบข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตของของผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ส่วนราชการกองช่าง จากการตรวจสอบโดยการสุ่มรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏดังนี้ ผู้ควบคุมงานมีการออกไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างทุกวัน การจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และพบการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ รวบรวมจัดทำเป็นรายงานสรุปประจำเดือน ของผู้ควบคุมงาน มีการจัดทำตามระยะเวลาและขั้นตอน ที่มีรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้บังคับบัญชาทราบ และมีจำนวน ๕ โครงการที่พบว่ามีค่าปรับ เนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ยังคงดำเนินไปตามข้อกำหนด ขอบเขตของโครงการ จึงขอทำขั้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ให้จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจำสัปดาห์ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทันที เพื่อให้ทราบและหาทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของงานก่อสร้างร่วมกันได้ทันที

ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

๔. ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุมัตินำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง ขออนุมัติ
เข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองช่าง
หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามในเอกสาร ของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการกองคลัง
ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาดน้ำ

เห็นชอบ



(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาดน้ำ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดน้ำ

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ



(นายเข็มทอง คำภูแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดน้ำ

แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Engagement Plan)

หน่วยรับตรวจ : กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ : ตรวจสอบการควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. ระเบียบการทรงวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๖๕ (๓), ๑๒๙, ๑๓๒, ๑๗๖, ๑๗๗, ๑๗๘ และตามนัยแห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖๖

๓. หนังสือสั่งการ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๕๘๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว.๙๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ และที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว.๐๕๒๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดไว้ในสัญญา
๓. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมการก่อสร้าง มีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม
๔. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการควบคุมการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. การสุ่มสอบทานโครงการตามการจัดทำข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. การสุ่มสอบทานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Operation Plan TanNoeng Subdistrict Administrative Organization.)
๓. การตรวจสอบ และสังเกตการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
๔. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ : จำนวน ๑๐ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

วิธีการตรวจสอบ :

๑. ใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง สัญญาจ้าง แบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ตรวจสอบและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตรวจสอบการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวันกำหนดลงมือดำเนินการ วันกำหนดส่งมอบงานและผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง และสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องว่าถูกต้องหรือไม่

๒. การสังเกตการณ์ สอบถามยอด สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ : นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ กข-๖๗-๐๑

กระดาษทำการตรวจสอบการควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง

หน่วยรับตรวจ กองช่าง ผู้ตรวจสอบ นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
ผู้รับตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้สอบทาน นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
งวดที่ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ตรวจสอบ ๑๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (Examination of original Documents): รายละเอียดการตรวจสอบการควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง

รายการ	สิ่งที่ตรวจพบ
<p>๑. การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๑) ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แต่งตั้งตามระเบียบฯ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้แต่งตั้ง</p> <p>๒) การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ผู้ควบคุมงานก่อสร้างออกไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างทุกวัน</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างทุกวัน</p> <p>๓) การจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกวัน</p> <p><input type="checkbox"/> มีการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างแต่ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔) การจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้คณะกรรมการทราบทุกสัปดาห์</p> <p><input type="checkbox"/> มีการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้คณะกรรมการทราบตอนส่งมอบงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p>	

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ กช-๖๗-๐๑

กระดาษทำการตรวจสอบการควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง

หน่วยรับตรวจ	กองช่าง	ผู้ตรวจสอบ	นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
ผู้รับตรวจ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ผู้สอบทาน	นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
งวดที่ตรวจสอบ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	วันที่ตรวจสอบ	๑๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (Examination of original Documents): รายละเอียดการตรวจสอบการควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง

รายการ	สิ่งที่ตรวจพบ
<p>๒. โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางช้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒๔๐,๕๐๐.- บาท (สุ่มตรวจ จำนวน ๑ โครงการ)</p> <p>๑) การดำเนินโครงการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> โครงการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง <input type="checkbox"/> โครงการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จแต่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาจ้าง หรือ แบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง <p>๒) การคำนวณประมาณการโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> มีการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละรายการตรงกับยอดรวมของงบประมาณ <input type="checkbox"/> มีการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ <p>๓) การตรวจทานวางแผนและการคำนวณราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> มีการตรวจทานและตรวจสอบการคำนวณราคากลางตาม แบบรูป และรายละเอียดที่กำหนดถูกต้องครบถ้วน <input type="checkbox"/> ไม่มีการตรวจทานและตรวจสอบการคำนวณราคากลางตาม แบบรูป และรายละเอียด ที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง <p>๔) แบบรูป และรายละเอียดโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> มีความถูกต้องครบถ้วนตรงกัน <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้องครบถ้วน <p>๕) ผลการตรวจรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> มีความถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา <input type="checkbox"/> มีความถูกต้องไม่ครบถ้วนตามสัญญา <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้องครบถ้วนและมีการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง <p>๓. อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> มีค่าปรับ จำนวน ๖,๐๒๕.๐๐ บาท (จำนวน ๒๕ วัน ค่าปรับวันละ ๒๔๑ บาท) <input checked="" type="checkbox"/> มีการเบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๔,๔๗๕.๐๐ บาท <input type="checkbox"/> อื่น ๆ ระบุ 	

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาดหนึ่ง
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ กองช่าง
 ผู้รับตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 งดที่ตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระตําขังการตรวจสอบการควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง

นางสาวศุภรัตน์ คำโสมภ
 นางสาวศุภรัตน์ คำโสมภ
 ๑๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

รหัสกระตําขังการ กข-๖๗-๐๑

การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (Examination of original Documents): รายละเอียดฉบับที่ตกลงจ้างหมากก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง/ E - Bidding ปี ๒๕๖๗

วคป. ที่สัญญา	รายการ	คำสั่งที่	สัญญา จ้างเลขที่	จำนวนเงิน ที่ท่าสัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	จำนวนวัน ทำสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ส่ง มอบงาน	ตรวจ รับงาน	วันที่ เบิกเงิน	หลักประกัน สัญญา
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นภายในหมู่บ้าน สายทางขังเรียงบ้านนาเตียง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาดหนึ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ตามข้อบัญญัติปี ๖๗)	๗๔๕/๖๖	๐๐๑/๖๗ CNTR- ๐๐๑๕๖/๖๗	๒๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท	นายศิริวัฒน์ พงศ์พันธ์ (พจก. นพรัตน์ก่อสร้าง ๑๕๕๓)	๖๐ วัน	๑๖ ก.พ. ๖๗	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	๑๒,๐๒๕.๐๐ บาท
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดงมีชัยไปบ้านจําปา หมู่ที่ ๕ ตำบลตาดหนึ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ตามข้อบัญญัติปี ๖๗)	๗๔๕/๖๖	๐๐๒/๖๗ CNTR- ๐๐๑๕๖/๖๗	๓๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท	นายศิริวัฒน์ พงศ์พันธ์ (พจก. นพรัตน์ก่อสร้าง ๑๕๕๓)	๖๐ วัน	๑๖ ก.พ. ๖๗	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	๑๔,๘๒๕.๐๐ บาท
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางบ้านโนนตุ่ม หมู่ที่ ๘ ตำบลตาดหนึ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร - โภกสุวรรณ (ตามข้อบัญญัติปี ๖๗)	๗๔๖/๖๖	๐๐๓/๖๗ CNTR- ๐๐๑๕๖/๖๗	๓๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท	นายศิริวัฒน์ พงศ์พันธ์ (พจก. นพรัตน์ก่อสร้าง ๑๕๕๓)	๖๐ วัน	๑๖ ก.พ. ๖๗	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	๘,๗๒๕.๐๐ บาท
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านตาดหนึ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาดหนึ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ตามข้อบัญญัติปี ๖๗)	๗๔๗/๖๖	๐๐๔/๖๗ CNTR- ๐๐๑๕๖/๖๗	๕๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท	นายศิริวัฒน์ พงศ์พันธ์ (พจก. นพรัตน์ก่อสร้าง ๑๕๕๓)	๖๐ วัน	๑๖ ก.พ. ๖๗	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	๒๓,๘๗๕.๐๐ บาท
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านตาดหนึ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลตาดหนึ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	๗๔๘/๖๖	๐๐๕/๖๗ CNTR- ๐๐๑๕๖/๖๗	๕๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท	นายศิริวัฒน์ พงศ์พันธ์ (พจก. นพรัตน์ก่อสร้าง ๑๕๕๓)	๖๐ วัน	๑๖ ก.พ. ๖๗	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	๒๓,๘๗๕.๐๐ บาท

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเื้อง
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ : กองช่าง
 ผู้รับตรวจ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 งวดที่ตรวจสอบ : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระดาษทำการตรวจสอบการควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง
 ผู้ตรวจสอบ : นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
 ผู้สอบทาน : นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
 วันที่ตรวจสอบ : ๑๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

รหัสกระดาษทำการ กช-๖๗-๐๑

การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (Examination of original Documents): รายละเอียดฉบับที่ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง/ E - Bidding ปี ๒๕๖๗

ว.ด.ป. ทำสัญญา	รายการ	คำสั่งที่	สัญญา จ้างเลขที่	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	จำนวนวัน ทำสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ส่ง มอบงาน	ตรวจ รับงาน	วันที่ เบิกเงิน	หลักประกัน สัญญา
๑๕ มี.ค. ๖๗	โครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตาลเื้อง ตำบลตาลเื้อง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร	๐๕๓๓/๖๗	๐๑๖/๖๗ CNTR- ๐๐๒๑๘/๖๗	๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท	นางอุทัยภรณ์ พรทพา (หลง. พรชนะก่อสร้าง)	๖๐ วัน	๑๘ พ.ค. ๖๗	-	-	-	๘,๓๐๐.๐๐ บาท
มี.ค. ๖๗	โครงการปรับปรุงถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา เดียง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาลเื้อง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร	๐๕๔/๖๗	๐๐๗/๖๗ CNTR- ๐๐๒๑๘/๖๗	๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท	นางอุทัยภรณ์ พรทพา (หลง. พรชนะก่อสร้าง)	๖๐ วัน	๑๘ พ.ค. ๖๗	-	-	-	๕,๔๐๐.๐๐ บาท
๒๐ มี.ค. ๖๗	โครงการขยายเขตท่อเมนใต้ประปาจากหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเื้อง ถึงแยกบ้านหนองหลัก ช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลตาลเื้อง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร	๐๕๕/๖๗	๐๐๘/๖๗ CNTR- ๐๐๒๒๐/๖๗	๑๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท	นางอุทัยภรณ์ พรทพา (หลง. พรชนะก่อสร้าง)	๓๐ วัน	๑๙ เม.ย. ๖๗	-	-	-	๖,๗๐๐.๐๐ บาท

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กองช่าง
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระดาษทำการตรวจสอบการควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง
 ผู้ตรวจสอบ
 ผู้สอบทาน
 วันที่ตรวจสอบ

นางสาวศุภรัตน์ คำโสมภา
 นางสาวศุภรัตน์ คำโสมภา
 ๑๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

รหัสกระดาษทำการ กช-๖๗-๐๑

การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (Examination of original Documents): รายละเอียดฉบับที่ติดกล่องจ้าง เฉพาะเจาะจง/ E - Bidding ปี ๒๕๖๗

วคป. ที่สัญญา	รายการ	ผลการ ตรวจรับ	ค่าปรับ	การเบิกจ่าย	เลขที่โครงการ	เลขบัญชี	เลขคู่มือรับ	หมายเหตุ
๑๔.๖.๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น ภายในหมู่บ้าน สายทางวังโรงเรียนบ้านนาแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ตามข้อบัญญัติปี ๖๗)	ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา	มีค่าปรับ จำนวน ๖,๐๒๕.๐๐ บาท	การเบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๓๔,๔๗๕.๐๐ บาท	๖๖๑๒๒๐๓๓๑๐	๖๖๑๒๒๐๓๒๗๘	๖๗๐๓A๑๓๓๕๓๕๑๐	
๑๔.๖.๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านดงมีชัยไปบ้านจำปา หมู่ที่ ๕ ตำบล เนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ตาม ข้อบัญญัติปี ๖๗)	ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา	มีค่าปรับ จำนวน ๙,๙๒๕.๐๐ บาท	การเบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๖๖,๕๗๕.๐๐ บาท	๖๖๑๒๒๒๓๕๖๔	๖๖๑๒๒๒๐๐๗๓๓๓	๖๗๐๓A๑๓๓๕๕๕๑๘	
๑๔.๖.๖๖	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ถนนสายทางบ้านโนนดุม หมู่ที่ ๘ ตำบล ตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร - โคกสุวรรณ (ตามข้อบัญญัติปี ๖๗)	ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา	มีค่าปรับ จำนวน ๔,๔๗๕.๐๐ บาท	การเบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๙,๐๒๕.๐๐ บาท	๖๖๑๒๒๒๒๕๒๗๒	๖๖๑๒๒๒๐๐๗๓๗๐	๖๗๐๓A๑๓๓๕๕๖๙๗	
๑๔.๖.๖๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านตาลเนิน หมู่ ที่ ๑ ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร (ตามข้อบัญญัติปี ๖๗)	ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา	มีค่าปรับ จำนวน ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท	การเบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๖๕,๕๕๐.๐๐ บาท	๖๖๑๒๒๒๒๕๑๔๙	๖๖๑๒๒๒๐๐๗๓๓๓	๖๗๐๓A๑๓๓๕๕๘๗๓	
๑๔.๖.๖๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านตาลเนิน หมู่ ที่ ๙ ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร (ตามข้อบัญญัติปี ๖๗)	ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา	มีค่าปรับ จำนวน ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท	การเบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๖๕,๕๕๐.๐๐ บาท	๖๖๑๒๒๒๒๕๓๐๔	๖๖๑๒๒๒๐๐๗๓๓๓	๖๗๐๓A๑๓๓๕๕๒๒๘	
๑๔.๖.๖๗	โครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลตาลเนิน ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดน ดิน จังหวัดสกลนคร				๖๗๐๓๓๕๓๕๘๑๐๘	๖๗๐๓๒๒๒๐๑๓๓๓๓	๖๗๐๓A๑๓๓๕๕๒๒๘	

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสกระตาศษาทำการ กษ-๖๗-๐๑

กระตาศษาทำการตรวจสอบการควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง

หน่วยรับตรวจ กองช่าง
ผู้รับตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งวตที่ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
๑๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (Examination of original Documents): รายละเอียดฉบับที่ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง/ E - Bidding ปี ๒๕๖๗

วตป. ทำสัญญา	รายการ	ผลการ ตรวจรับ	คำปรับ	การเบิกจ่าย	เลขที่โครงการ	เลขคู่สัญญา	เลขคุมตรวจรับ	หมายเหตุ
๑๙ มี.ค. ๖๗	โครงการปรับปรุงถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาเดียง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่าง แดนดิน จังหวัดสกลนคร	-	-	-	๖๗๐๓๓๓๕๕๐๕๑	๖๗๐๓๒๒๐๑๔๔๔๕	-	
๒๐ มี.ค. ๖๗	โครงการขยายเขตท่อประปาจากหน้าที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ถึงแยก บ้านหนองหลักช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	-	-	-	๖๗๐๓๓๓๖๗๑๑๕	๖๗๐๓๒๒๐๑๔๔๑๑	-	

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏดังนี้ ผู้ควบคุมงานมีการออกไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างทุกวัน การจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และพบการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ รวบรวมจัดทำเป็นรายงานสรุปประจำเดือน ของผู้ควบคุมงาน มีการจัดทำตามระยะเวลาและขั้นตอน ที่มีรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ยังคงดำเนินการขอขอกำหนด ขอบเขตของโครงการ จึงขอขำบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ให้จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจำสัปดาห์ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อให้ทราบและหาทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของงานก่อสร้างร่วมกันได้ทันที

หน่วยรับตรวจ กองช่าง ได้รับทราบข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ จากหน่วยตรวจสอบภายใน
เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไป

(ลงชื่อ)



หน่วยรับตรวจ

(นายชูเกียรติ นันทราช)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้สอบทาน

(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลतालเนิ่ง

ที่ สน 77603/

วันที่ 15 มีนาคม 2567

เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลतालเนิ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลतालเนิ่ง

อ้างถึงหนังสือตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567

ผู้รับจ้างทำการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลतालเนิ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนด โดยหักค่าปรับเกินสัญญาก่อสร้าง จำนวน 25 วัน ค่าปรับวันละ 241 บาท เป็นเงิน 6,025 บาท เท่ากับ $240,500 - 6,025 = 234,475$ บาท จึงเห็นควรเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 234,475 บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชูเกียรติ นันทรราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น - เห็นชอบ
.....

(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลतालเนิ่ง

ความเห็น - เห็น
.....

(นายเข็มทอง คำภูแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลतालเนิ่ง

รายงานผลการตรวจการจ้าง

วันที่ 15 มีนาคม 2567

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนินที่ 794/2566 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายใบรายงานผลการตรวจรับงานจ้างฉบับนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งรับจ้างโดย หจก. นพรัตน์ก่อสร้าง (1993)

วงเงินงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 234,475 บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน-)

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ดำเนินการตรวจผลงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 385 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทค.203/45 ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามหนังสือรับเลขที่ 491/2567 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ สถานที่ตั้งของโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 234,475 บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน-) โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 2 ฉบับ โดยมอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นายสมควร มิตรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาลเนิน

ประธานกรรมการตรวจรับงานจ้าง

สืบเอก



(สุรวิทย์ ศรีนุกูล)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการตรวจรับงานจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายวรุฒิ เหมะชูลิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการตรวจรับงานจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

ที่ สน 77603/

วันที่ 15 มีนาคม 2567

เรื่อง ตรวจสอบงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เรียน ประธานกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

ตามหนังสือส่งมอบงานจ้างของ หจก. นพรัตน์ก่อสร้าง (1993) หนังสือรับเลขที่ 491/2567 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567 ผู้รับจ้างตรวจสอบงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ ได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างโครงการดังกล่าว นั้น

ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายการงานตามสัญญาจ้างแล้ว จึงเห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างดำเนินการตรวจสอบรับงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายชาติกร ฤกษ์งาม)

นายช่างโยธาอาวุโส/ผู้ควบคุมงาน

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

เพื่อได้โปรดพิจารณาตรวจสอบรับงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป

(นายชูเกียรติ นันทราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

- ทราบ แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างขอนัดตรวจสอบรับงานในวันที่ 15 มีนาคม 2567

เวลา 11.30 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

(นายสมควร มีธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาลเนิน

ประธานกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

ใบรับรองผลการปฏิบัติงานจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วยข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายใบรับรองผลการปฏิบัติงานจ้าง ฉบับนี้ได้ทำการตรวจผลงานก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 001/2567 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

- (1) ชื่องานที่ทำการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 001/2567 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566
- (2) ชื่อผู้รับจ้าง หจก. นพรัตน์ก่อสร้าง (1993)
- (3) วงเงินค่าจ้าง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 240,500 บาท (-สองแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)
- (4) สถานที่ทำการตรวจรับงานจ้าง ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 385 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.203/45 ของกรมทางหลวงชนบท

** หมายเหตุ หักค่าปรับเกินสัญญาก่อสร้าง จำนวน 25 วัน ค่าปรับวันละ 241 บาท เป็นเงิน 6,025 บาท เท่ากับ 240,500 - 6,025 = 234,475 บาท

วงเงินงบประมาณคงเหลือเป็น 234,475 บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)

(5) วันส่งมอบงาน และวันตรวจรับผลงาน

5.1 ผู้รับจ้างได้ขอส่งมอบงาน ตามหนังสือรับเลขที่ 491/2567 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567

5.2 และผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบแล้ว เห็นว่างานเสร็จครบถ้วน ตามงวดงานแล้ว ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ปรากฏตามบันทึกของผู้ควบคุมงาน ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจผลงานก่อสร้างที่ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

5.3 วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน

() อยู่ในระหว่างที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

(✓) เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นเวลา.....25.....วัน

(6) ผลการตรวจการจ้าง

(✓) ผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการ รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้างทุกประการ

() ผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ มีรายละเอียดบางประการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้างกล่าวคือ.....

() อื่น ๆ.....

งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 001/2567 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2567 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้งเลขที่ 794/2566 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ตามผู้มีรายชื่อบันทึก ได้พร้อมกันตรวจรับงวดงานดังกล่าวข้างต้นไว้แล้ว

วงเงินงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 234,475 บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี อุกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวารุฒิ เหมะจุลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรวิทย์ เหมะสุลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3
ตำบลतालหนึ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรวิทย์ เหมะจุลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สิบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรุดิ เหมะธลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

ลิบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรุฒิ เหมะสุติน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรุฒม์ เหมะรุสลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สิบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรุฒิ เหมะธูลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สิบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรวิทย์ เหมะจุลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3
ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ
รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรวุฒิ เหมะธูลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3
ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ


(นายวรุดิ เหมะจุลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3

- ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

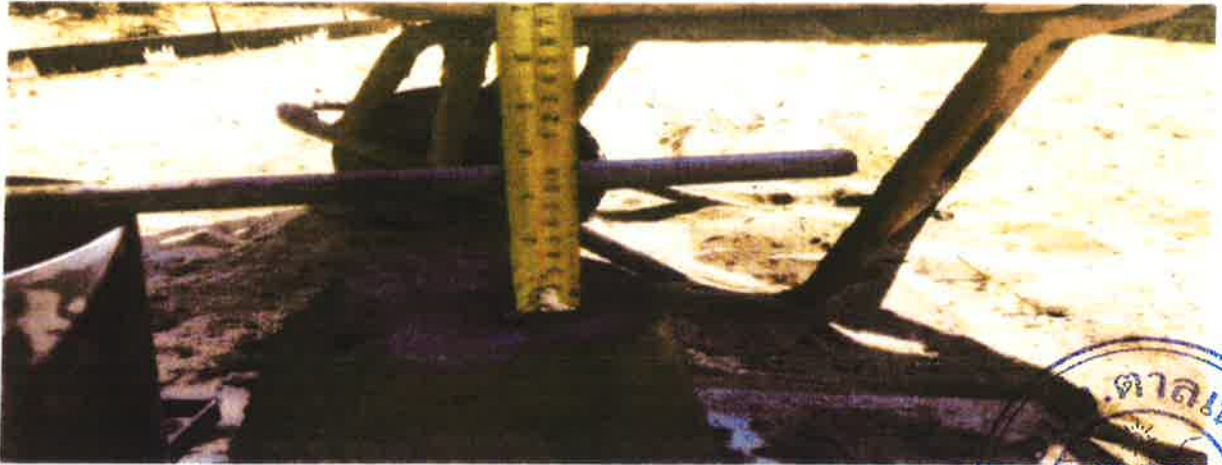

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีนุกูล)

กรรมการ

(นายวรวิทย์ เหมะจุลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลतालนึ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรวุฒิ เหมะธูลีน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี อุกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรุดิ เหมะธลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลतालनेंग อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีนุกูล)

กรรมการ

(นายารวุฒิ เหมะรุสสิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก


(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรวุฒิ เหมะธูลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3
ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

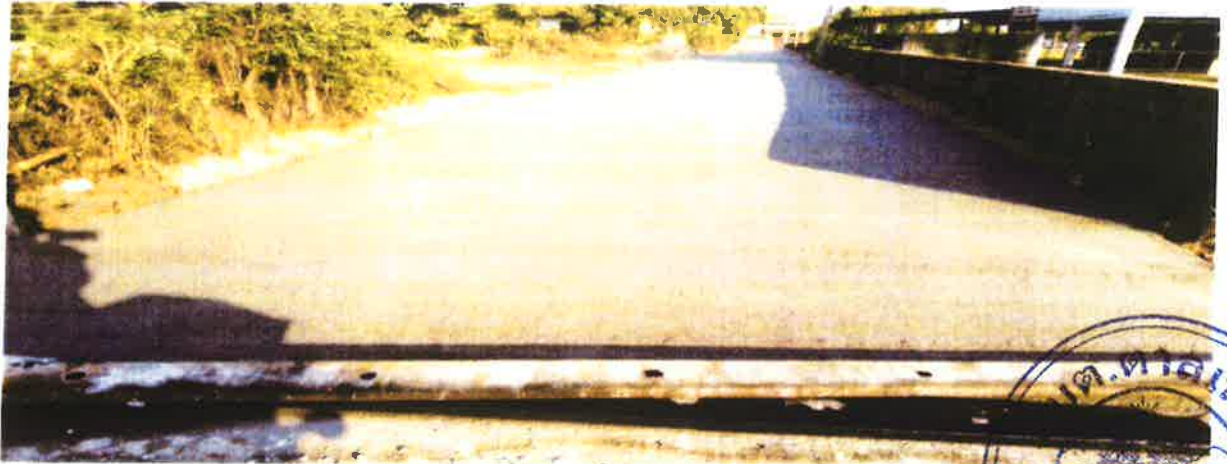

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ
รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายารวุฒิ เหมะจุลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สิบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรวุฒิ เหมะธูลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเ็นิ่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีนุกูล)

กรรมการ

(นายวรวิทย์ เหมะจุลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ
รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมภาร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สิบเอก


(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรวิทย์ เหมะจุลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางช้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3
ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

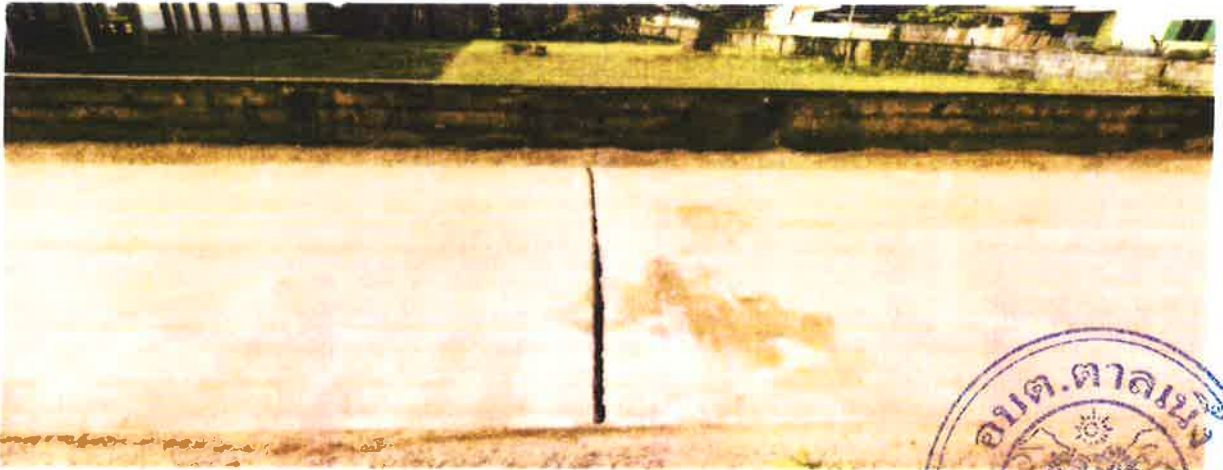

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรวุฒิ เหมะจุลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายขณะดำเนินการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี อุกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรุดิ เหมะอุลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายป้ายโครงการ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติตรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สิบเอก

(สุรวิทย์ ศรีบุญกุล)

กรรมการ

(นายวรวิทย์ เหมะธูลีน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมภาร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สืบเอก

(สุรวิทย์ ศรีนุกุล)

กรรมการ

(นายวรวิทย์ เหมะธูลิน)

กรรมการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเตียง หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ

รับรองภาพถูกต้อง

(นายชาติรี ฤกษ์งาม)

ผู้ควบคุมงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (สำหรับประกอบการเบิกเงิน)

(นายสมควร มีธรรม)

ประธานกรรมการ

สิบเอก

(สุรวิทย์ ศรีนุกูล)

กรรมการ

(นายวรวิทย์ เหมะธูลิน)

กรรมการ
